


CAMBIO DE ZONIFICACIÓN/ DEMOLICIÓN

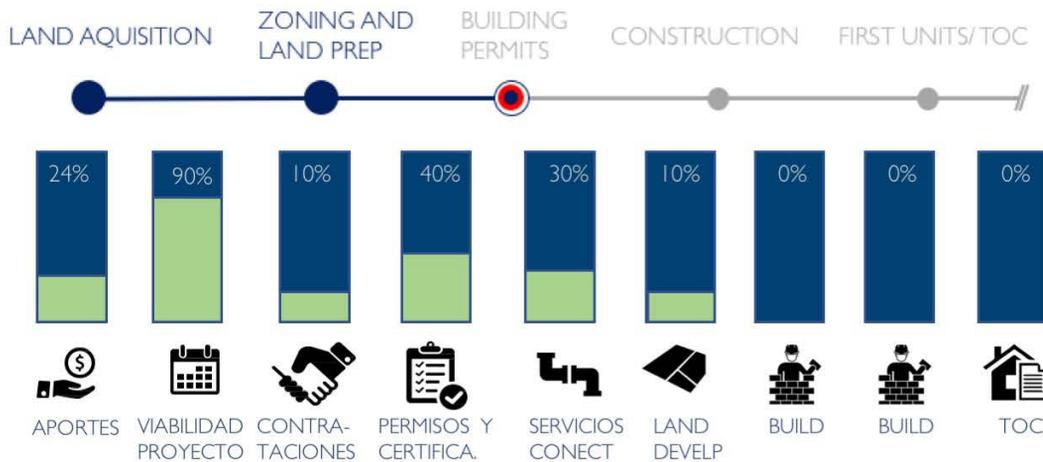

12% AVANCE PROYECTO

24% FONDEO RECIBIDO

25% TIEMPO TRANSCURRIDO

REALIZADO

- ✓ Aprobado por **unanimidad** en primera audiencia con el consejo, y postulados a una segunda audiencia.
- ✓ En segunda Audiencia, cambio de **ZONIFICACION APROBADO (6/7)**.

- ✓ Finalizadas las labores de **DEMOLICIÓN**. Estructuras, placas, la totalidad de los pinos, rejas, etc.
- ✓ Se detecto puntos de **servicios en el terreno** (minimizando la necesidad de conexión a la ciudad y trabajos sobre las vías)
- ✓ Se optimizó el diseño arquitectónico y el **Site Plan**.

- ✓ Se inició la fase II de arquitectura e Ingeniería.
- ✓ Se inició la aprobación del **Site Plan** por parte de la ciudad.
- ✓ Desarrollados **Estudios de Suelos y Ambientales**
- ✓ Iniciada la labor de los **Arbolistas** a fin de remover el resto de la vegetación.



FOTOS VIDEOS

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN/ DEMOLICIÓN



VISITAS RECIENTES AL TERRENO

