


CAMBIO DE ZONIFICACIÓN/ DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

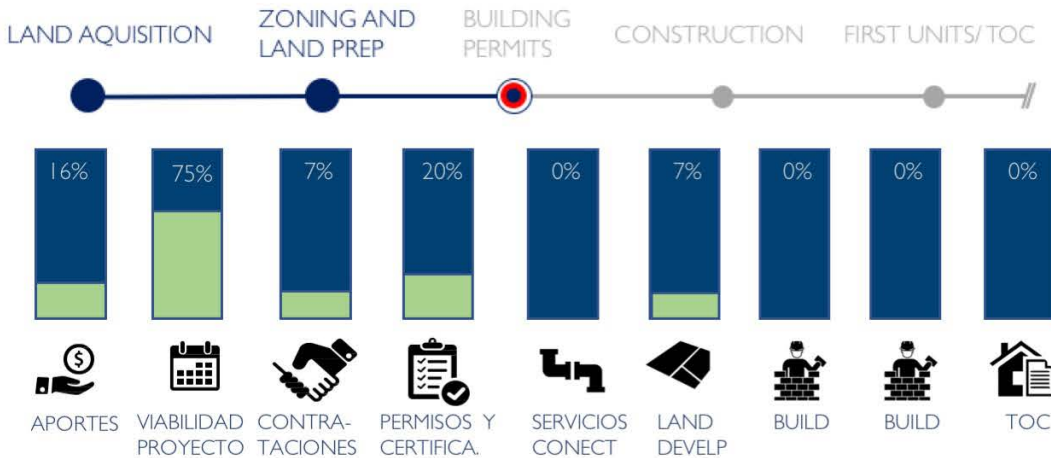

6% AVANCE PROYECTO

16% FONDEO RECIBIDO

19% TIEMPO TRANSCURRIDO

REALIZADO

- ✓ Desarrollo de planos preliminares y concepto
- ✓ Reunión preliminar de ZONIFICACIÓN con todas las áreas de la ciudad
- ✓ 2500 convocatorias enviadas para la presentación a la comunidad
- ✓ Audiencia ante los comisionados para proponer Zonificación

- ✓ Ajustes según feedback de la comunidad
- ✓ Reunión con Urbanistas de la Ciudad de Miami Gardens
- ✓ Presentación en el comité de prevención de crimen del Distrito
- ✓ Reunión con la unidad de diseño para prevención de crimen de la ciudad.

- ✓ Contratación de servicios de DEMOLICIÓN
- ✓ Permisos de Demolición, Subpermisos de Agua, Electricidad, e ingeniería.
- ✓ Inicio de labores de Demolición y remoción de árboles.



Community Meeting / April 18th/ Lester Brown Park



CPTED and Crime Prevention Practitioners / May 4th / Miami Gardens Police Department





Neighborhood Watch Program/ May 1st/ Betty Ferguson Complex



FOTOS VIDEOS

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN/ DESARROLLO ARQUITECTÓNICO



FOTOS



VIDEOS
